




Durante la administración del Sr. **Intendente Arnaldo Samaniego**, han sido iniciados con **Fondo para Proyectos Especiales 64** proyectos de obras, los cuales son encarados por Comisiones Vecinales y fiscalizados por la Dirección de Obras Municipales. En este concepto ha sido desembolsada la suma total en guaraníes de **4.048.514.871**.

GRÁFICOS REPRESENTATIVOS.

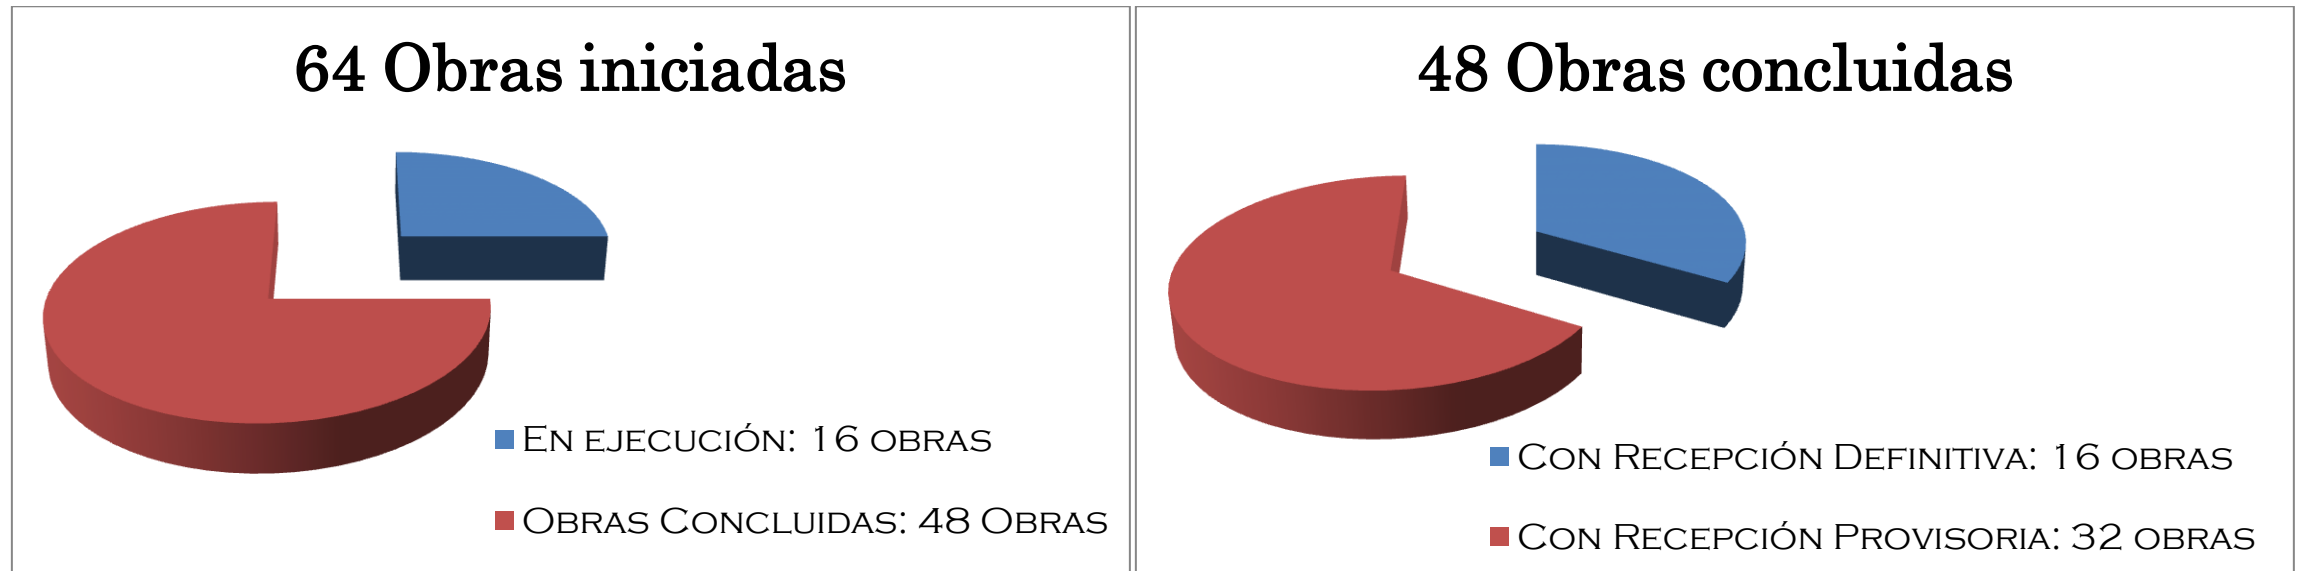

Coordinadora: Ñepytyvo (Zona E).

Nº	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Familias Unidas	Alcantarillado sanitario	Willian Richardson e/ Sajonia y La Paz	Vista Alegre	Ing. Rodolfo Coronel	13/08/2012	100%	90	27/09/2012		63596880
TOTAL											63596880

Coordinadora: Ara Poty (Zona I).

Nº	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	San Jorge	Remoción y Reposición de empedrado	San Jorge	San Jorge	Arq. Oscar Rolon Gauto	06/06/2012	100%	90	18/08/2012		63725970
2	San Juan	Mejoramiento de Infraestructura	Juan XXIII e/ Dr. López Moreira	Las Lomas-Manora	Constructora ECO S.A.	19/06/2012	100%	90	30/07/2012	25/10/2012	63630413
3	Ñu Pora	Remoción y reposición de empedrado	Obispo López e/ Cap. Martínez, Pino y Velazco	San Jorge	CONSTRUC OBRAS	07/05/2012	100%	60	27/07/2012	22/10/2012	63277500
TOTAL											190633883

Coordinadora: Roberto L. Pettit (Centro Municipal Nº 1).

Nº	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Alianza	Remoc. Y Reposic. Empedrado	32 Pydas. e/ Antequera y Tacuary	R.L. Pettit	COTECNA	25/04/2012	100%	60	12/06/2012	05/10/2012	59920000
2	6 de Enero	Pav. empedrado y canalización de Hº	43 Pydas. e/ Brasil y Parapiti	Roberto L. Pettit	Ing. Cesar Recalde Princigalli	06/06/2012	100%	s/plazo	10/09/2012		62875950
3	Amistad II	Muro de Contención	Republicano	Republicano	Constructora ECO	24/05/2012	50%	90			63660000
TOTAL											186455950

Coordinadora: Ko'e Pyahu (Centro Municipal Nº 1).

Nº	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Ara Pyahu	Pavimento de Hormigón Rígido	Dr. Benjamín Aceval e/ 14 de Mayo, 15 de Mayo y O'Leary	Tacumbu	Arq. Edgar Díaz de Bedoya	20/06/2012	100%	90	24/08/2012		63550000
2	Adriano Irala	Mejoramiento de Paseo Central	Adriano Irala e/ Chiang Kai Chek y Montevideo	Tacumbu	Intec Ingeniería S.R.L.	10/08/2012	90%	90			63437500
3	Club de Leones	Construcción de Salón Multiuso	9º Pydas. c/ Colón	Tacumbu	Tecno Dinámica S.R.L.	18/01/2012	100%	150	11/06/2012		63494100
TOTAL											190481600

Coordinadora: Tembiapo Aty (Centro Municipal Nº 1).

Nº	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Pa'i Martín	Empedrado	Antequera e/ 18 y 19 Proyectadas	Obrero	Cotecna	07/05/2012	100%	60	16/07/2012	Solicitud	63430000
2	Patricio Escobar	Cancha multiuso y cerco	Morelos e/ 17 y 18 Pydas.	Obrero	Arq. María Gloria Guerrín	11/06/2012	100%	60	28/08/2012		63701000
3	Amigos de la Avenida Cerro León	Paseo Central	Cerro León e/ E.E.U.U. y Caballero	Obrero	Cotecna	07/05/2012	100%	60	22/08/2012	Solicitud	63135000
4	Fulgencio Yegros	Mejoramiento de Paseo Central	Yegros e/15 y24 Proyectadas	Obrero	COTECNA	06/06/2012	100%	90	07/09/2012		63650000
5	Mita Vy'aha	Mejoramiento de Infraestructura de Paseo Central	EEUU e/16 y 17 Proyectadas	Obrero	Arq. Félix Martínez	17/08/2012	95%	90			63700000
TOTAL											317616000

Coordinadora: Ojoykɛrepa (Centro Municipal N° 2).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Perpetuo Socorro	Muro de Contención	Félix Cañete esq. Tte. Ángel Benítez	Virgen de la Asunción	NARTEX S.R.L.	06/06/2012	100%	90	21/07/2012	24/10/2012	63673623
TOTAL											63673623

Coordinadora: Oñondivepa (Centro Municipal N° 2).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Capilla Medalla Milagrosa	Ampliación de Capilla	calle 2 c/ calle1	Botánico	Tecno Dinámica S.R.L.	18/01/2012	100%	150	16/07/2012		63496729
2	Santa Elena	Pavimento tipo empedrado	22 de Junio e/ Cnel. Montiel y Gral. Delgado	Santa Rosa	Constructora Nartex	04/06/2012	100%	90	04/09/2012		63780000
3	Francisco Roa	Pavimento tipo Empedrado y muro de P.B.C.	Francisco Roa e/ Sacramento y Vadivia	Trinidad	C.I.C.E.	26/04/2012	100%	90	31/07/2012		63765200
4	El Agricultor Paraguayo	Hermoseamiento de Plaza	Avda. 1º Pdte. e/ Agricultor Paraguayo	Mburucuya	Constructora Nartex	26/12/2011	100%	90	17/05/2012	25/07/2012	63775000
5	Amistad	Muro de Contención	Caballero - Carrillo - Callejón 1	Loma Pyta	CICE	24/04/2012	100%	90	17/06/2012	19/09/2012	63670200
6	Loma Pyta Poty	Pavimento tipo empedrado	Asunción Escalada e/ Tte. Monjes y Blanca Romero	Botánico	Constructora Nartex	11/05/2012	100%	90	11/08/2012		63753000
7	Villa Antelco	Pavimento tipo empedrado y Mej. Plaza	Audidores de la Guerra del Chaco - Arq. Alfaro	Mburucuya	C.I.C.E.	28/05/2012	100%	90	29/08/2012		63778000
TOTAL											446018129

Coordinadora: Jopoi (Centro Municipal N° 3).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Jerovía	Desagüe Cloacal	Ingavi e/ Mayor López y Madrina de la guerra del Chaco	San Vicente	Arq. Oscar Rolón Gauto	10/09/2012	75%	90			63503374
2	Gondra	Remoción y reposición de empedrado	Gondra e/ Pinzón y Magallanes	San Vicente	Kuarahy Ingeniería	02/07/2012	98%	90			63601200
3	Colina Vice Pdte. Sánchez	Desagüe Pluvial	Vice Pdte. Sánchez e/ Teodoro Mongelos y H. Giménez	Ciudad Nueva	Kuarahy Ing.	06/06/2012	100%	90	11/09/2012		63590000
TOTAL											190694574

Coordinadora: Murucuyá (Centro Municipal N° 4).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Cruce Eusebio Ayala y Montanaro	Tapa de Hormigón sobre canal	Montanaro e/ Avda. Eusebio Ayala	San Pablo	Constructora ECO	28/12/2011	100%	60	25/04/2012	03/07/2012	63646000
2	16 de Agosto	Mejoramiento de Plaza	Toba y Tacuara	San Pablo	Intec Ingeniería S.R.L.	13/02/2012	100%	120	09/07/2012	Solicitud	63473930
3	Vecinos de Teletón	Remodelación de la Plaza 1º de Marzo	Calle sin Nombre e/ Maskoi y calle sin Nombre	San Pablo	Construc. Obras-Arq. Godoy	19/06/2012	100%	60	06/09/2012		63750000
TOTAL											190869930

Coordinadora: Kɔ'eti (Centro Municipal N° 5).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Divino Niño Jesús	Estructura de Piedra Bruta y Puente de Hº Aº	Pasillo Arenera y arroyo México	Ricardo Brugada	Kuarahy Ingeniería SACIA	29/10/2012		90			63307000
TOTAL											63307000

Coordinadora: Jeruti (Centro Municipal N° 6).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	La Gran Esperanza	Pavimento tipo empedrado	Rancho 8 y San Luis	Tacumbu	GIZEH Ingeniería	03/08/2012	100%	90	10/09/2012	Solicitud	63679962
2	Vecinos Unidos Zona 5A	Empedrado	Martín Fierro e/ Urcisino Velázquez y Pilcomayo	Tacumbú	Gizeh Ingeniería	03/08/2012	100%	90	08/09/2012	Solicitud	63691012
3	Guaraní	Pavimento tipo empedrado		Bañado Sur	Arq. Heriberto Galeano	27/02/2012	100%	30	16/03/2012	11/09/2012	54084140
4	Nanawa	Pavimento tipo empedrado	Virgen del Lujan y Bañado Koeti	Tacumbu	Gizeh Ingeniería	10/08/2012	100%	90	10/09/2012	Solicitud	63677262
5	Sajonianos Unidos	Pavimento rígido sobre empedrado	Coronel Lirio e/ Capitán Bozzano y Coronel Caminos	Sajonia	CIECA	09/08/2012	100%	90			63690000
TOTAL											308822376

Coordinadora: Tape Porá (Centro Municipal N° 6).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Armonía	Pav. asfáltico sobre empedrado	Testanova e/ Dr. Montero y Dr. Garcete	San Antonio	HRTV Construcciones	07/05/2012	100%	60	26/06/2012	11/10/2012	63694136
TOTAL											63694136

Coordinadora: Marangatu (Centro Municipal N° 7).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Nuestra Señora de la Asunción	Regularización asfáltica	Dr. Prieto e/ Bahía Negra y Cap. Grau	Tablada Nueva	CICE	26/04/2012	100%	90	03/08/2012		63778000
2	Cadete Insfrán	Pavimento de hormigón hidráulico	Callejón Insfran y Dublín	Tablada Nueva	Ing. Toribio Yampey	29/10/2012		90			63650000
3	Vecinos Unidos de la calle Dublín	Empedrado y muro de piedra	Bahía Negra e/ Villarrica y San Estanislao	Tablada Nueva	Arq. Félix Martínez	07/06/2012	100%	90	10/09/2012		63730000
TOTAL											191158000

Coordinadora: Tenondete (Centro Municipal N° 8).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Oñondivepa	Mejoramiento de Plaza	Madame Lynch e/ Vía Férrea y Dr. Semidei	Mbokayaty	Arq. Félix A. Martínez López	25/04/2012	100%	90	16/08/2012	Solicitud	63760000
2	Overava II	Desagüe cloacal	Overava e/ Eloy Páez y Tte. 2do. Rojas	Salvador del Mundo	Constructora A.G.	23/04/2012	100%	90	09/07/2012	22/10/2012	63374995
3	Tenondete	Desagüe cloacal	Dr. Noguez e/ Eloy Páez y Tte. Rojas	Salvador del Mundo	Constructora A.G.	23/04/2012	100%	90	09/07/2012	22/10/2012	63374995
4	Jepopyhy	Empedrado y desagüe pluvial	Sgto. Leguizamón y ruta transchaco	Mbocayaty	Arq. Rubén Giménez Sanabria	07/05/2012	100%	60	25/06/2012	05/09/2012	63000000
TOTAL											253509990

Coordinadora: V'ya Pave (Centro Municipal N° 8).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Vecinos y Amigos	Pavimento tipo empedrado	Yaragua e/ Yaguaron y Aregua	Loma Pyta	CICE	06/06/2012	100%	90	11/10/2012		65778000
2	Cástulo Fretes	Mejoramiento de plaza	calle 3 e/ calle 9 y calle 10	Loma Pyta	Constructora ECO	22/08/2012	100%	90	11/10/2012		63659200
3	Golondrina III	Pavimento tipo empedrado	José Zarza e/ A. Paredes y Manfred	Loma Pyta	Constructora ECO S.A.	07/05/2012	100%	90	18/06/2012	23/10/2012	63670200
4	Santa Teresita	Desagüe Pluvial	Mayor Isidro Jara y Palo Santo	Loma Pyta	Tecno-Dinámica,	02/07/2012	95%	90			63372000
TOTAL											256479400

Coordinadora: Ñasaindy (Centro Municipal N° 9).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Nueva Generación	Pavimento de Hormigón Armado	Leandro Cacavillos e/ 26 y Chávez de Ferreiro	Las Residentas	R.F. Construcciones	24/04/2012	100%	90	07/08/2012		63332500
2	Plaza del Futuro	Pavimento tipo empedrado	Dora del Cerro e/ de Felice y Poetas Paraguayos	Las Colinas	HRTV construcciones	11/06/2012	100%	60	06/09/2012		63470000
3	El Portal II	Pavimento tipo empedrado	Schvartzman e/ Quintana y Máxima Lugo	De las Residentas	R.F. Construcciones	03/05/2012	100%	90	03/08/2012		63339238
4	Jajapota	Pavimento tipo empedrado	Pura Agüero e/ San ramón y Lima	Zeballos Cue	C.C. Construcciones	11/06/2012	100%	90	25/07/2012		62912500
5	Máxima Lugo	Remoción y reposición de empedrado	Lionel E. Lara e/ Ana de Ferreiro, Máxima Lugo y Washington	Zeballos Cue	C.C. Construcciones	23/07/2012	95%	90			62735000
6	Juntos Podemos	Pavimento tipo empedrado	Pura Agüero Vera y Lima	Las Residentas	R.F. Construcciones	25/04/2012	100%	90	13/07/2012		59129290
7	San Juan	Pav. Tipo empedrado y badén	Félix Trujillo e/ calle XII y Hernán Neimer	Las Residentas	Eduardo Martí Medina	26/07/2012	70%	90			63690380
TOTAL											438608908


Coordinadora: Laguna Cateura (Centro Municipal N° 10).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Virgen del Carmen	Construcción de Tinglado	pasillo 2 e/ pasillo 1	Republicano	INTEC S.R.L.	27/01/2012	100%	150	02/08/2012		63269200
2	Unión San José Obrero	Remoción y reposición de empedrado	Gral. Aquino e/ 31 y 33 Pydas	Republicano	Excavaciones y Canales S.A.	17/08/2012	65%	90			63446000
3	Cooperadora San Miguel de Fe y Alegría	Mejoramiento de infraestructura	39 Pydas. y Ciudad de Chibas	Republicano	Intec Ingeniería S.R.L.	27/12/2011	100%	90	05/03/2012	26/07/2012	63532790
4	Capilla San Miguel-Parroquia Cristo Solidario	Mejoramiento de Infraestructura	39 Pydas y Tte. Lesme	Republicano	Intec Ingeniería S.R.L.	27/12/2011	100%	90	30/03/2012	26/07/2012	63501940
5	San Miguel	Pavimento tipo Empedrado	39 Pdas. e/ Tte. Lesme y Tte. Cantaluppi	Republicano	Excavaciones y Canales S.A.	17/08/2012	50%	90			63337200
6	16 de Julio	Remoción y reposición de empedrado-Cuneta Hª.	Escritores del Paraguay e/ Borys Deboff y calle 5	Las Residentas	Constructora Knito	13/08/2012	85%	90			63000000
TOTAL											380087130

Coordinadora: Parque Yukyty (Centro Municipal N° 10).

N°	Comisión Vecinal	Obra	Dirección	Barrio	Empresa	Orden Inicio	Avance	Plazo	R. P.	R. D.	Monto
1	Villa Corina	Mejoramiento del Complejo Deportivo Comunitario	Ezequiel González e/ De la Gracia y Blas Redes	Santa Ana	Ing. Hugo Daniel Patiño	09/08/2012	100%	90			62741557
2	Primavera	Empedrado	Primavera y Arroyo Cateura	Yukyty	Ing. Cesar Recalde	29/05/2012	100%	180	03/09/2012	Solicitud	63091025
3	Capilla Virgen de la Merced	Ampliación de Capilla-Aulas-Muralla	E.E.U.U. y Pizarro	Yukyty	Tecno Dinámica S.R.L.	02/01/2012	100%	90	08/03/2012	04/07/2012	63517780
4	Los Portales	Refacción de Centro Municipal	calle entrada al cerro Lambaré	Yukyty	Intec Ingeniería S.R.L.	12/07/2012	70%	90			63457000
TOTAL											252807362

REFERENCIA:

 Obras que han fenecido plazos contractuales para su culminación o recepción definitiva.
